HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA

Unidad Puesta en Marcha HPMM

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

Mayo 2023

Minuta informativa de avance de obra / al 30 de abril 2023

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, está ubicado en el límite sur de la comuna de Villa Alemana, a un costado de la Autopista Troncal Sur con enlace a calle Maturana.

Es una obra de infraestructura en salud del Gobierno de Chile que reemplazará al actual Hospital de Quilpué, resolverá las necesidades de nueva infraestructura y atención de salud que requieren los habitantes de la Provincia de Marga Marga, estimada en 485 mil habitantes, pertenecientes a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, perteneciente a la red de del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entregará atención hospitalaria (cerrada) y ambulatoria (atención abierta), con una capacidad de 282 camas y las prestaciones de complejidad que lo convierten en centro de referencia de la provincia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA	
Obra	Construcción Hospital Provincial Marga Marga
Servicio de Salud	Viña del Mar Quillota
Contratista	Empresa Acciona Construcción SA
Superficie a construir	75.171 m2
Fecha de Inicio de obra	13/05/2020
Fecha de término de obra	13/05/2024
Plazo contractual	1.460 días
Nivel Complejidad	Alta
Población beneficiaria	485.000 personas (Provincia de Marga Marga)
Número de camas	282 camas

El Hospital Provincial Marga Marga considera las siguientes áreas

9 pabellones.

3 salas de parto integral.

32 boxes médicos.

19 boxes otros profesionales.

24 boxes procedimientos.

14 boxes Unidad de Emergencia

15 cupos diálisis.

8 boxes odontológicos.

12 camas UCI adultos.

24 camas UTI adultos.

6 camas UTI Infantil.

8 camas UTI neonatología.

15 camas pensionado.

166 camas hospitalización adulto

28 camas hospitalización infantil

23 camas hospitalización mujer

Avance de construcción al 30 de abril 2023

Avance físico programado

61,89 %

Avance físico real

57,85%

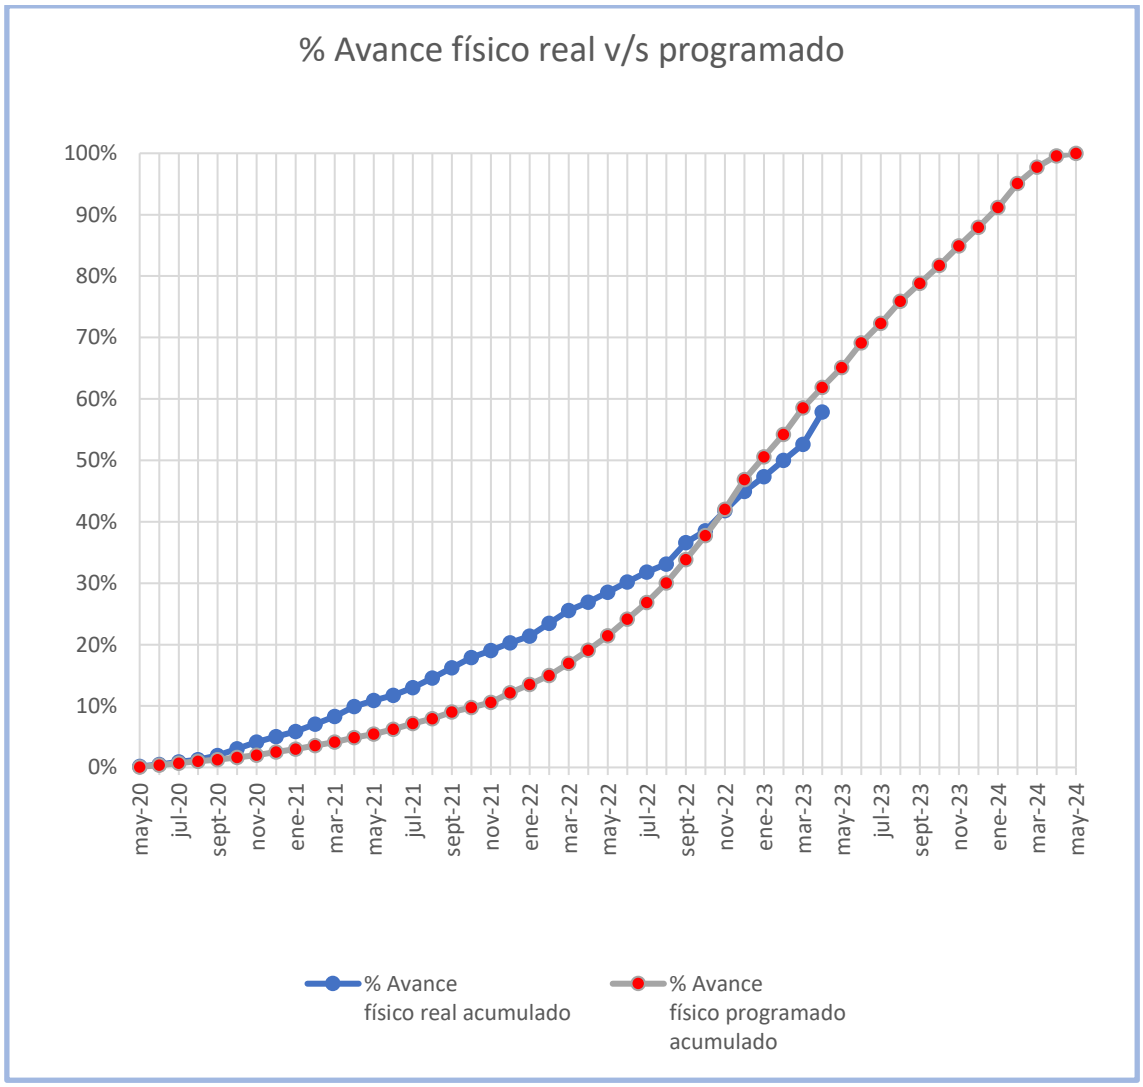

Descripción Avance de Obra, al 30 de abril 2023

- ✓ El avance de la **Obra Gruesa** (hormigón armado) para el edificio Principal es de un 100%, Edificio Atención Abierta es de un 100%, Recintos Técnicos es un 100%, Auditorio es un 100%, SAMU es un 100%, el avance la obra gruesa general es de un 99%.

- ✓ Se continúa avanzando en las partidas de sobrelosas, zócalos, impermeabilización de recintos húmedos, estructuras metálicas, fachadas, tabiquería, baldosas e instalaciones, en el Edificio de Atención Abierta y Edificio Principal.

- ✓ El avance físico de **terminaciones es 30,68%** (Considera las partidas de pavimentos, cielos, revestimientos exteriores, revestimientos interiores, puertas exteriores, puertas interiores y quincallerías, ventanas interiores, pinturas y barnices y terminaciones).

- ✓ El avance físico de **especialidades es: 43,50%** (Considera especialidad de Gases Clínicos, Tratamiento de Residuos Sólidos, Alcantarillado, Evacuación de Aguas Lluvias, Instalaciones Térmicas, Climatización y Ventilación, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Corrientes Débiles, Sistemas de Seguridad y Redes Contra Incendio, Gases Clínicos, Correo Neumático, Sistema de circulaciones mecánicas, Combustibles y Sistema de limpiafachadas).

Gobierno de Chile
gob.cl

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Región de Valparaíso
Ministerio de Salud

Nuevo Hospital Provincial Marga Marga SSVQ

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Una de las principales características de la construcción de este nuevo Hospital es la eficiencia energética, para generar un importante ahorro y permitir a sus usuarios experimentar una sensación de bienestar de alto estándar.

ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

ACTIVAS

Sectorización de los sistemas de iluminación
En lugares donde se prevea aportes de luz natural.

Sistemas de distribución de climatización
A través de Unidades Manejadoras (UMAS) que proporcionan aire a los espacios acondicionados.

Sistemas de iluminación artificial
Interior y exterior tomando en cuenta la instalación de luminarias eficientes, tipo led.

Circuitos de climatización
Conectados al Control Centralizado que usará criterios de alta eficiencia energética.

Disminución del consumo de agua
Requerida en cada proceso, así como disminución de residuos.

Uso de sensores de detección de movimiento.

Sistema de Control Centralizado Autónomo.

PASIVAS

Temperatura interna
Utilización de materiales que nivelan fluctuaciones de temperatura interna.

Instalación de cubiertas
ecológicas de áreas verdes.

Ventanas exteriores con termopanel
instalación de quiebra vistas para proteger ventanas del sol.

Calefacción solar

$765
millones de pesos.
PROYECCIÓN DE AHORRO OPERACIONAL ANUAL CON ESTAS MEDIDAS IMPLMENTADAS.

hpmm.cl | #NuevoHospitalMargaMarga

Registro fotográfico de avance de obras:
