HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA

Unidad Puesta en Marcha HPMM

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

Junio 2023

Minuta informativa de avance de obra / al 30 de abril 2023

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, está ubicado en el límite sur de la comuna de Villa Alemana, a un costado de la Autopista Troncal Sur con enlace a calle Maturana.

Es una obra de infraestructura en salud del Gobierno de Chile que reemplazará al actual Hospital de Quilpué, resolverá las necesidades de nueva infraestructura y atención de salud que requieren los habitantes de la Provincia de Marga Marga, estimada en 485 mil habitantes, pertenecientes a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, perteneciente a la red de del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entregará atención hospitalaria (cerrada) y ambulatoria (atención abierta), con una capacidad de 282 camas y las prestaciones de complejidad que lo convierten en centro de referencia de la provincia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA	
Obra	Construcción Hospital Provincial Marga Marga
Servicio de Salud	Viña del Mar Quillota
Contratista	Empresa Acciona Construcción SA
Superficie a construir	75.171 m2
Fecha de Inicio de obra	13/05/2020
Fecha de término de obra	13/05/2024
Plazo contractual	1.460 días
Nivel Complejidad	Alta
Población beneficiaria	485.000 personas (Provincia de Marga Marga)
Número de camas	282 camas

El Hospital Provincial Marga Marga considera las siguientes áreas

9 pabellones.

3 salas de parto integral.

32 boxes médicos.

19 boxes otros profesionales.

24 boxes procedimientos.

14 boxes Unidad de Emergencia

15 cupos diálisis.

8 boxes odontológicos.

12 camas UCI adultos.

24 camas UTI adultos.

6 camas UTI Infantil.

8 camas UTI neonatología.

15 camas pensionado.

166 camas hospitalización adulto

28 camas hospitalización infantil

23 camas hospitalización mujer

Avance de construcción al 31 de mayo 2023

Avance físico programado

64,38 %

Avance físico real

61,54%

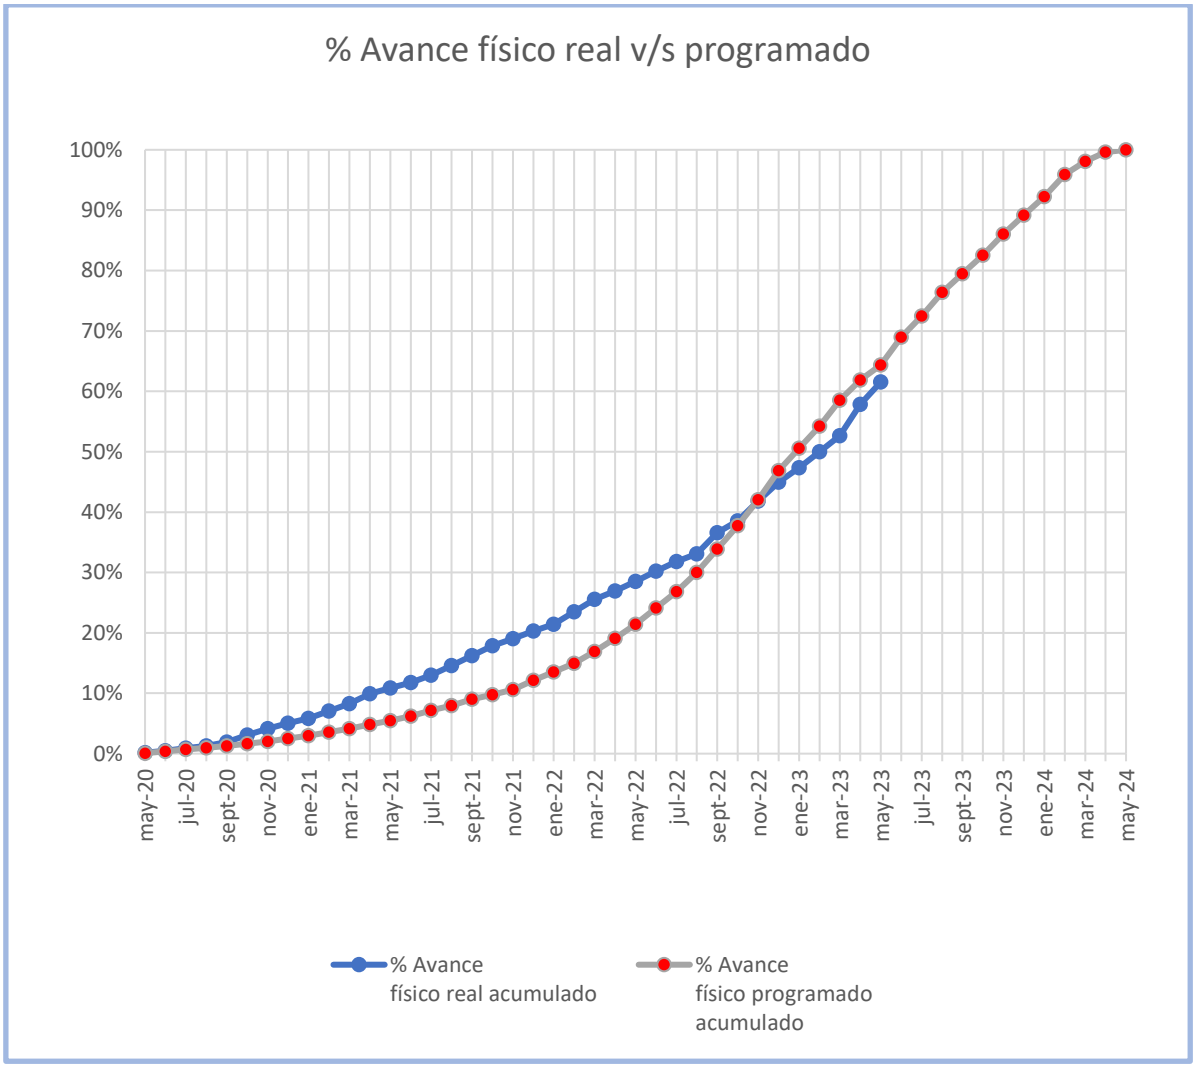

Descripción Avance de Obra, al 31 de mayo 2023

- ✓ El avance de la **Obra Gruesa** (hormigón armado) para el edificio Principal es de un 100%, Edificio Atención Abierta es de un 100%, Recintos Técnicos es un 100%, Auditorio es un 100%, SAMU es un 100%, el avance la obra gruesa general es de un 99%.

- ✓ Se continúa avanzando en las partidas de sobrelosas, zócalos, impermeabilización de recintos húmedos, estructuras metálicas, fachadas, tabiquería, baldosas e instalaciones, en el Edificio de Atención Abierta y Edificio Principal.

- ✓ El avance físico de **terminaciones es 34,35%** (Considera las partidas de pavimentos, cielos, revestimientos exteriores, revestimientos interiores, puertas exteriores, puertas interiores y quincallerías, ventanas interiores, pinturas y barnices y terminaciones).

- ✓ El avance físico de **especialidades es: 49,14%** (Considera especialidad de Gases Clínicos, Tratamiento de Residuos Sólidos, Alcantarillado, Evacuación de Aguas Lluvias, Instalaciones Térmicas, Climatización y Ventilación, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Corrientes Débiles, Sistemas de Seguridad y Redes Contra Incendio, Gases Clínicos, Correo Neumático, Sistema de circulaciones mecánicas, Combustibles y Sistema de limpiafachadas).

MODELO DE ATENCIÓN

El Nuevo Hospital Provincial Marga Marga se prepara para brindar una atención humanizada, **centrada en el paciente y su familia**, con más prestaciones y especialidades, énfasis en la ambulatorización de la atención, promoviendo la Calidad y Seguridad de la Atención y el trabajo en Red.

ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE, CON ENFOQUE DE DERECHOS, INTEGRAL Y FAMILIAR

- **Buen trato** a usuarios y funcionarios
- **Espacios terapéuticos amplios**, cómodos, con áreas de servicios propios
- Salas de espera **confortables**
- **34 Salas** de entrevistas a familiares
- Aula Hospitalaria
- **3 salas** de Parto Integral
- **Acompañamiento de pacientes** hospitalizados
- Áreas de **acceso libre** y de esparcimiento
- Atención con **enfoque intercultural**

MAYOR COMPLEJIDAD DE PRESTACIONES Y NUEVOS ESPECIALISTAS

- **Crecimiento** Unidad de Paciente Crítico Adulto
- Unidad de Paciente Crítico pediátrico y neonatológico
- **Aumento** de Pabellones Quirúrgicos
- Diálisis
- **Desarrollo y Consolidación** de especialidades médicas

ÉNFASIS EN LA AMBULATORIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

- Cirugía Mayor Ambulatoria
- Hospitalización Domiciliaria
- Unidad de Medicina Ambulatoria (UMA)

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN Y TRABAJO EN RED

- **Interacción** con la Red
- Seguimiento **post alta** de pacientes

HOSPITAL DIGITAL

- **Informatización** de procesos clínicos y administrativos
